EPI10 SALUD · OCTUBRE 2026

Convertir un revés en una oportunidad

Lo que ha cambiado en el proyecto, qué hacemos esta semana y cómo seguimos.

EPI 10

CONSTRUIDO

6

piezas construidas

ESTA SEMANA

2

líneas de trabajo

DOSSIER

21 oct

entrega del dossier

PREPARADA PARA

EPI10 Salud · Carmen Sosa

14 DE OCTUBRE DE 2026

REF. EPI10-2026-10

01 · DÓNDE ESTAMOS

Lo construido hasta hoy, pieza a pieza.

Así estaba el proyecto cuando llegaron las dos noticias: **lo que ya funciona** y lo que teníamos mapeado.

GRADO DE AVANCE DE CADA PIEZA


01	**El orquestador**	100%
02	**El generador de borradores de informe**	60%
03	**Las automatizaciones con Odoo**	90%
04	**Las automatizaciones con Healthie** Sobre la conexión que Healthie acaba de retirar.	85%
05	**El portal de la clienta en Healthie** Personalizado con la marca EPI10.	80%
06	**La pasarela de pago con Stripe**	100%

Lo que ya funciona sigue sirviendo. El orquestador, Odoo y el generador de informes no dependen de Healthie; lo que cambia es la pieza del portal de la clienta.

01 · DÓNDE ESTAMOS

Esto es lo que teníamos mapeado.

El sistema tiene un centro propio de EPI10, el orquestador, que conecta el pago, el portal de la clienta y Odoo, y que genera los informes. **Healthie ponía la cara:** todo lo que la clienta ve y hace.

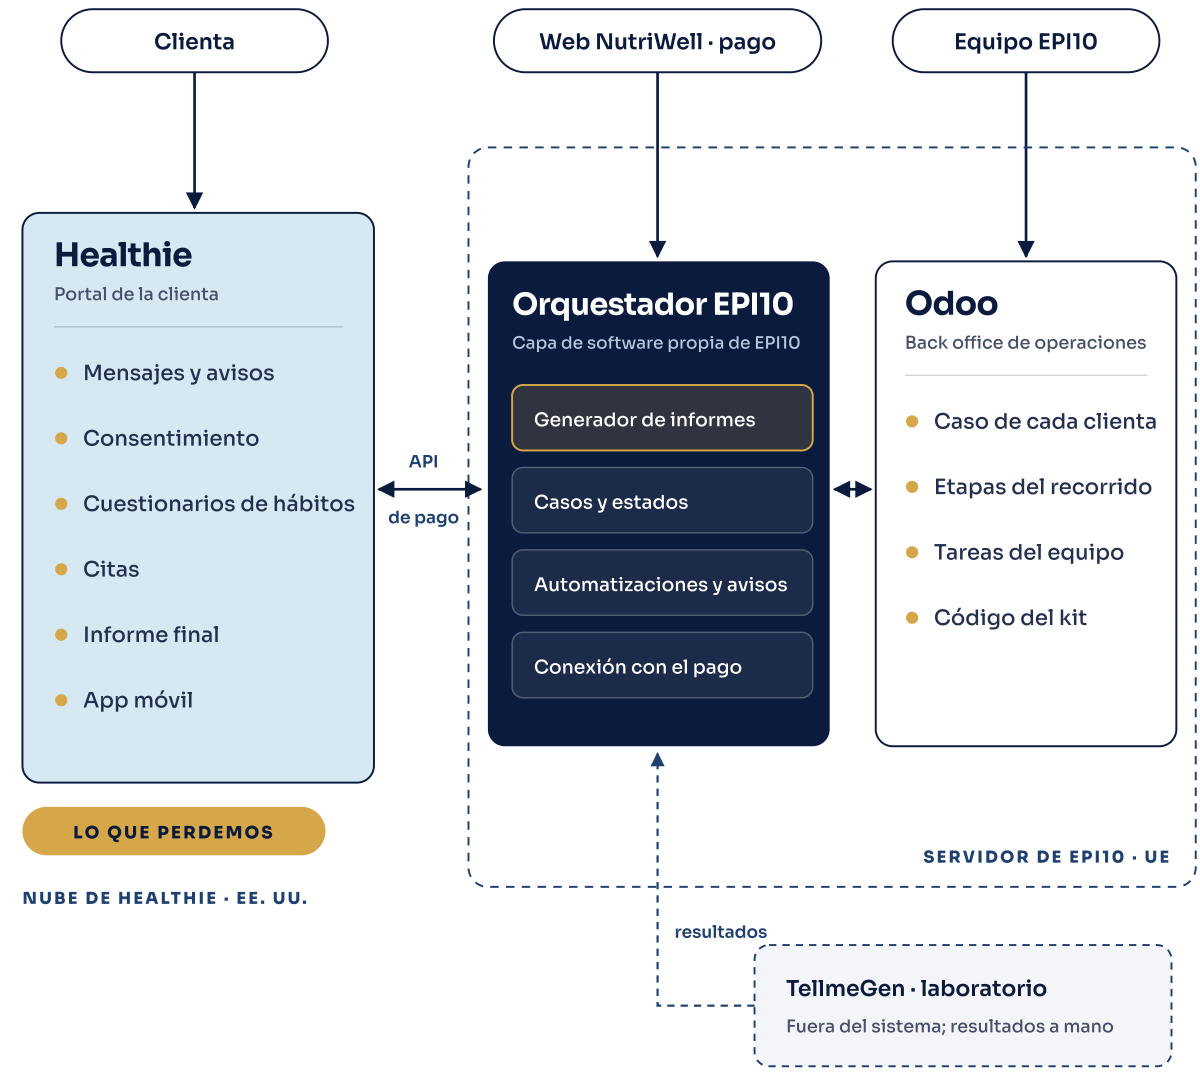

Arquitectura con Healthie. El orquestador, Odoo y el generador de informes siguen sirviendo tal cual. Lo que se cae es el bloque de la izquierda: el portal de la clienta entero.

02 · QUÉ PASÓ

Dos noticias que no dependen ni de vosotros ni de nosotros.

Se juntaron la semana pasada, con cuatro días de diferencia. Lo hemos hablado y **lo hemos alineado con vosotros**.

CRONOLOGÍA · OCTUBRE DE 2026

Lun 5 OCTUBRE
● **Escribís a Healthie.**
Nuestras automatizaciones con Healthie empiezan a fallar.

Mié 7 OCTUBRE
● **Healthie confirma las nuevas condiciones.**
Por escrito: la conexión pasa a ser un añadido de pago, o exige el plan Enterprise.

Jue 8 OCTUBRE
● **El proveedor de la web se cae.**
La web de EPI10 se queda sin proveedor.

Lun 12 OCTUBRE
○ **Festivo.**

Mié 14 OCTUBRE
● **Nos vemos y lo alineamos.**
Paramos el roadmap y dedicamos la semana a investigar a fondo.

2.1
Healthie
La conexión que usábamos deja de estar incluida en el plan.

2.2
Web de EPI10
El proveedor externo se cae del proyecto.

2.1 · HEALTHIE

Healthie sacó de su plan la conexión que usábamos para automatizar: se nos caen las automatizaciones.

La automatización del proyecto se apoya en una conexión (API) con la que nuestro sistema da de alta a cada clienta, le asigna sus formularios y le entrega el informe sin trabajo manual. Esa conexión venía incluida. **Dejó de estarlo.**

ANTES · HASTA EL VERANO DE 2026

API incluida

Venía dentro del **plan Group** que contrató EPI10, sin coste añadido. La probamos en verano y funcionaba.

Plan Group · API sin coste extra

→

DESPUÉS · DESDE SEPTIEMBRE

API de pago

475 $	950 $	1.900 $
al mes · año 1	al mes · año 2	al mes · año 3 y siguientes

Como añadido, **además del plan Group**. O dentro del plan **Enterprise**, sin precio público.

AL AÑO · API DE PAGO

≈ 22.800 $ /año

A partir del tercer año (1.900 $ × 12). Antes, unos 5.700 $ el primero y 11.400 $ el segundo. Siempre además del plan Group.

\+

ADEMÁS · MARCA BLANCA

Por cotizar

La app con la marca de EPI10 en Google Play. Healthie no ha respondido cuánto cuesta.

2.2 · WEB DE EPI10

ANTES

Proveedor externo

La llevaba un proveedor externo.

→

AHORA

Sin cubrir

El proveedor se ha caído del proyecto y la pieza queda sin cubrir.

03 · QUÉ HACEMOS ESTA SEMANA Y CÓMO SEGUIMOS

Paramos el roadmap y dedicamos la semana a investigar a fondo.

Lo asumimos como una seña de identidad: **tomar el toro por los cuernos** y convertir el revés en una oportunidad para que EPI10 dependa menos de terceros.

3.1

PRIMERA LÍNEA

La pieza del portal de cliente

Healthie era la mejor opción que habíamos encontrado. Si ya no sirve, hay que sustituirla. Estudiamos dos caminos.

a

Otra plataforma del mercado

Una investigación a fondo de las alternativas disponibles.

b

Desarrollo propio sobre software libre

La pieza pasa a ser de EPI10.

EN NÚMEROS Qué absorbe lo ya comprometido, qué no y su efecto en el calendario.

3.2

SEGUNDA LÍNEA

La web como sistema integrado

Aprovechando la idea del portal propio, planteamos un sistema todo integrado: **la web, el portal y las herramientas del equipo** con la misma interfaz y la misma imagen de marca, sin saltos entre una pieza y otra.

EN NÚMEROS Qué supone integrar la web en el mismo sistema, con su alcance y su plazo.

CÓMO SEGUIMOS

01

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

Os enviamos un dossier en profundidad.

Con las opciones que planteamos, sus costes y sus plazos.

02

DESPUÉS

EPI10 lo procesa internamente.

Con calma, el tiempo que haga falta.

03

FECHA POR ACORDAR

Reunión conjunta.

Nos sentamos todos y decidimos juntos cómo seguimos.

Sin cronómetro: lo importante es decidir bien.

Audentes fortuna iuvat.

La fortuna favorece a los audaces.

Está en nuestra mano convertir un revés en una oportunidad para salir más fuertes.

EPI10

CONTACTO

direccion@skilland.ai

skilland.ai

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Preparado para

EPI10 Salud
